BEOGRAD CENTAR (KUVAJTSKI KREDIT) - I FAZA
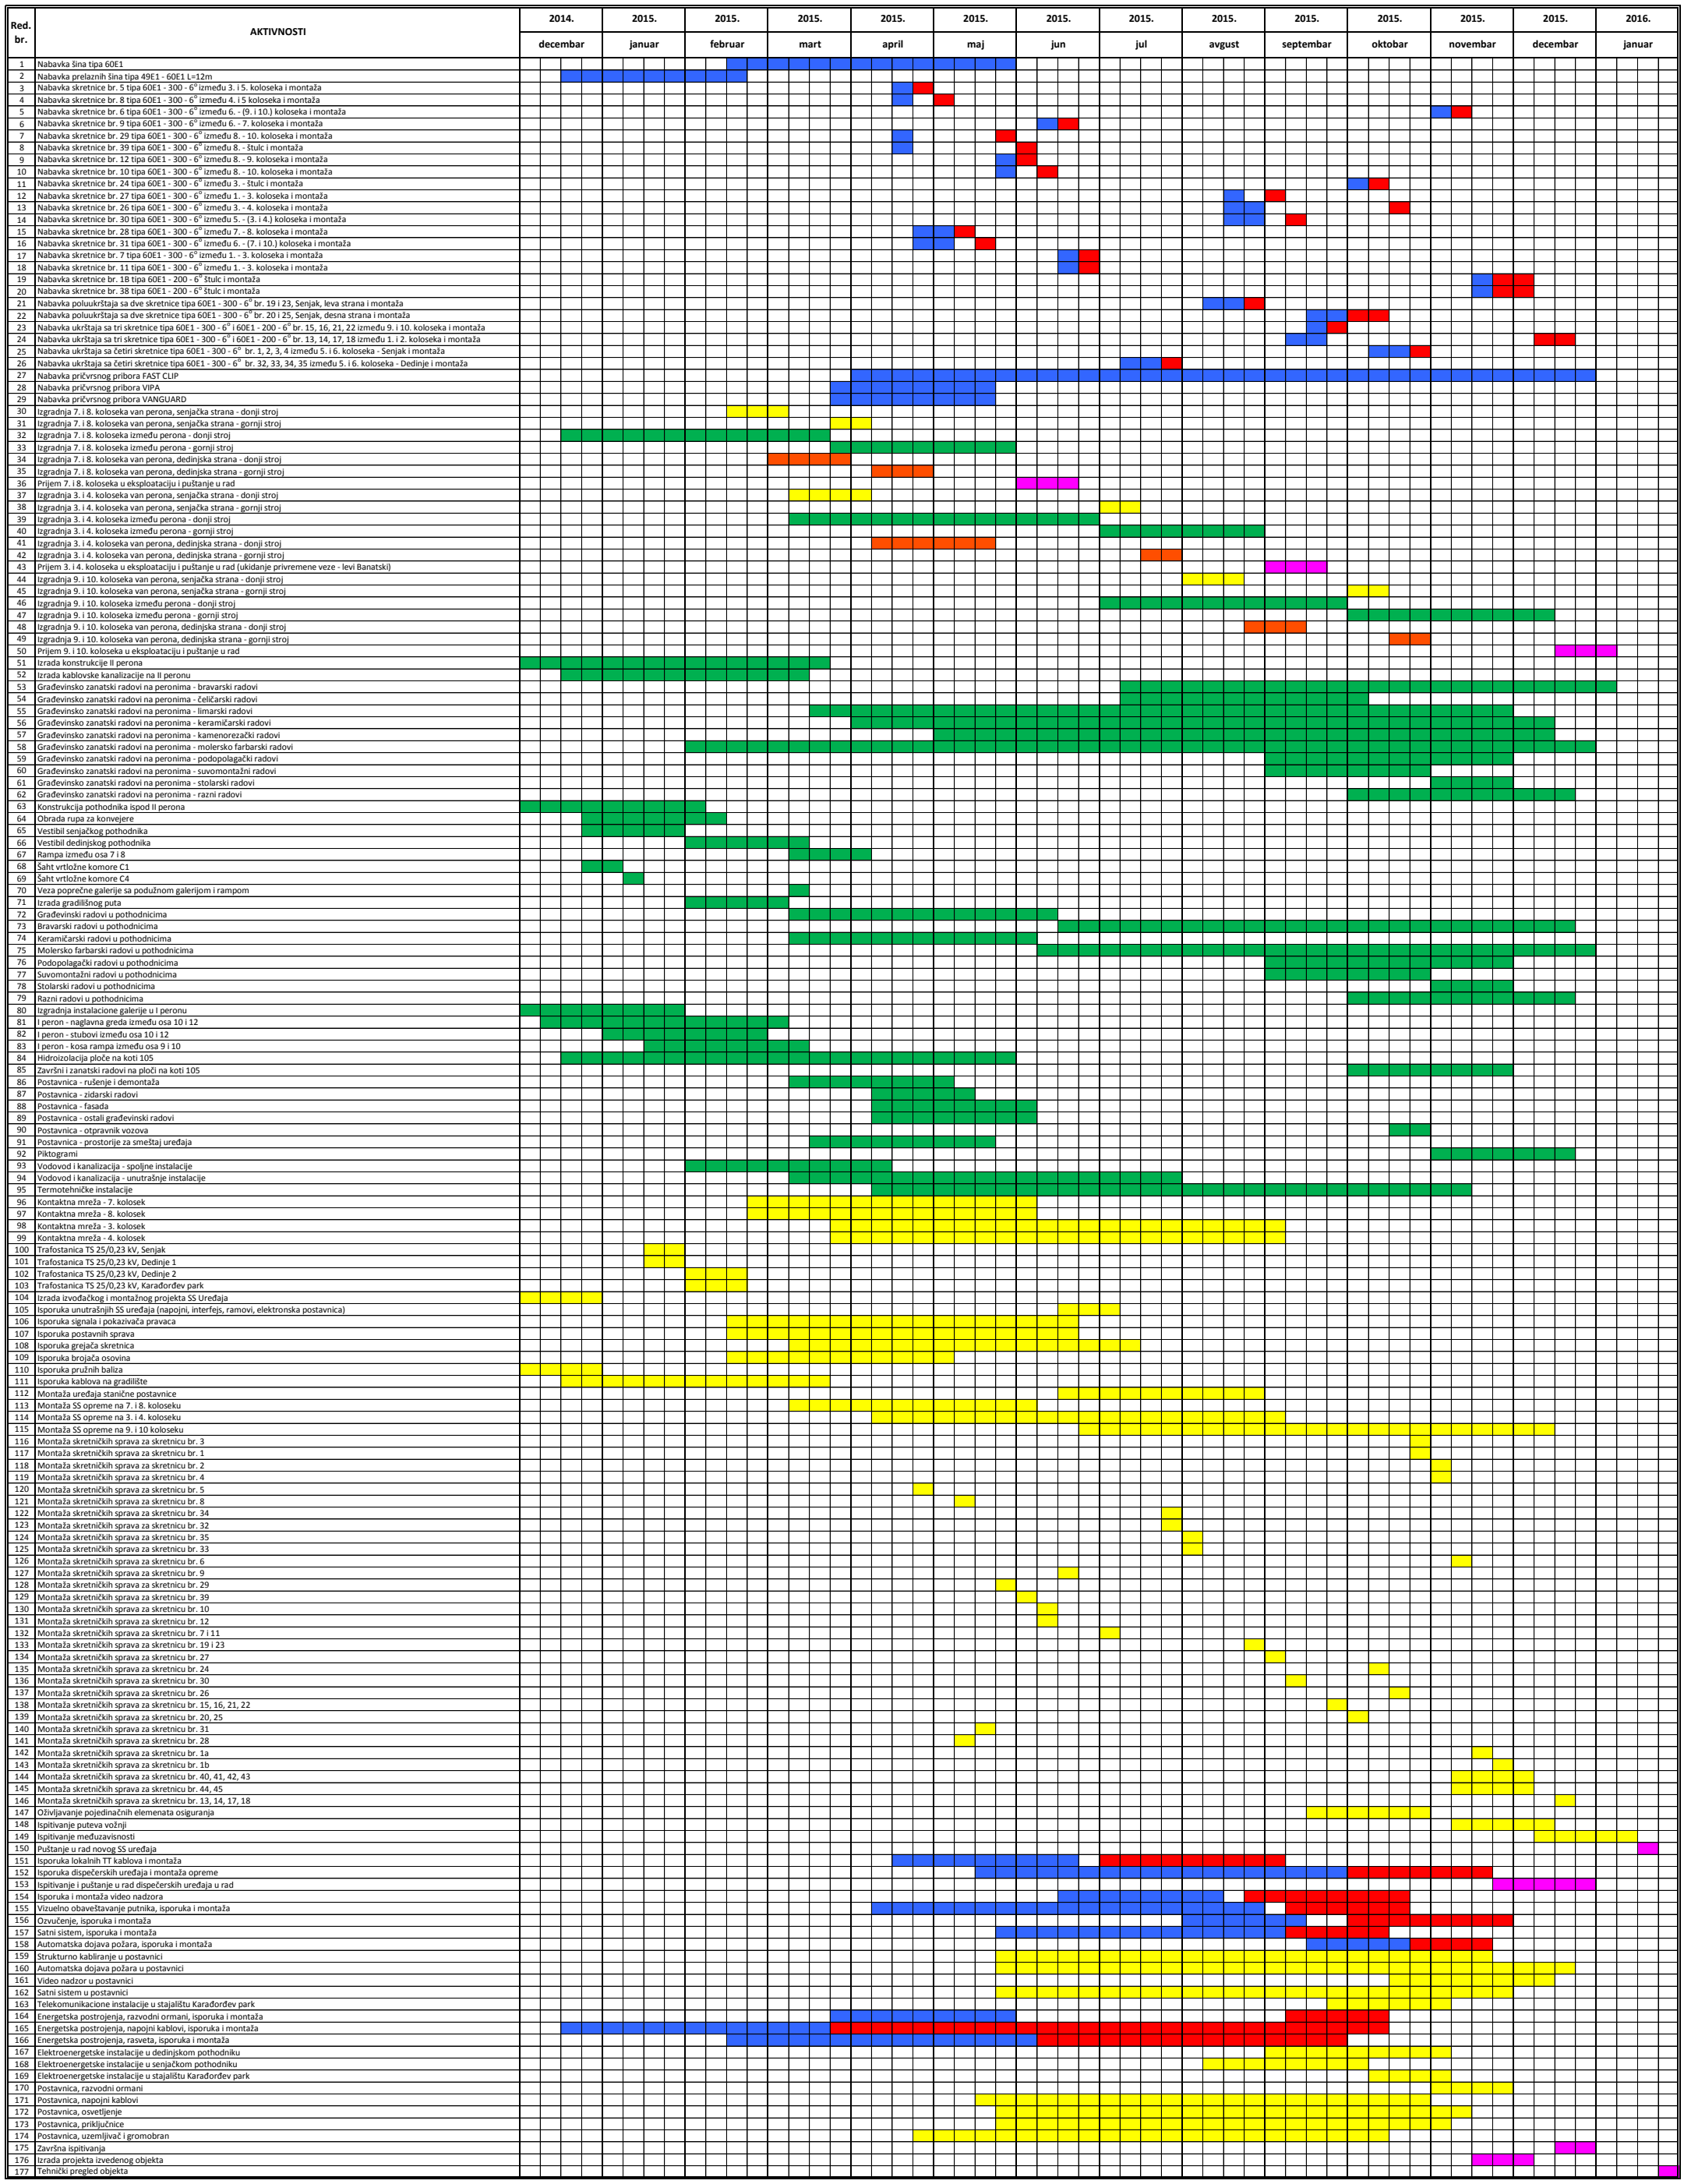
Red. br.	AKTIVNOSTI
1	Nabavka šina tipa 60E1
2	Nabavka prelaznih šina tipa 49E1 - 60E1 L=12m
3	Nabavka skretnice br. 5 tipa 60E1 - 300 - 6° između 3. i 5. koloseka i montaža
4	Nabavka skretnice br. 8 tipa 60E1 - 300 - 6° između 4. i 5 koloseka i montaža
5	Nabavka skretnice br. 6 tipa 60E1 - 300 - 6° između 6. - (9. i 10.) koloseka i montaža
6	Nabavka skretnice br. 9 tipa 60E1 - 300 - 6° između 6. - 7. koloseka i montaža
7	Nabavka skretnice br. 29 tipa 60E1 - 300 - 6° između 8. - 10. koloseka i montaža
8	Nabavka skretnice br. 39 tipa 60E1 - 300 - 6° između 8. - štulc i montaža
9	Nabavka skretnice br. 12 tipa 60E1 - 300 - 6° između 8. - 9. koloseka i montaža
10	Nabavka skretnice br. 10 tipa 60E1 - 300 - 6° između 8. - 10. koloseka i montaža
11	Nabavka skretnice br. 24 tipa 60E1 - 300 - 6° između 3. - štulc i montaža
12	Nabavka skretnice br. 27 tipa 60E1 - 300 - 6° između 1. - 3. koloseka i montaža
13	Nabavka skretnice br. 26 tipa 60E1 - 300 - 6° između 3. - 4. koloseka i montaža
14	Nabavka skretnice br. 30 tipa 60E1 - 300 - 6° između 5. - (3. i 4.) koloseka i montaža
15	Nabavka skretnice br. 28 tipa 60E1 - 300 - 6° između 7. - 8. koloseka i montaža
16	Nabavka skretnice br. 31 tipa 60E1 - 300 - 6° između 6. - (7. i 10.) koloseka i montaža
17	Nabavka skretnice br. 7 tipa 60E1 - 300 - 6° između 1. - 3. koloseka i montaža
18	Nabavka skretnice br. 11 tipa 60E1 - 300 - 6° između 1. - 3. koloseka i montaža
19	Nabavka skretnice br. 1B tipa 60E1 - 200 - 6° štulc i montaža
20	Nabavka skretnice br. 38 tipa 60E1 - 200 - 6° štulc i montaža
21	Nabavka poluukrštaja sa dve skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° br. 19 i 23, Senjak, leva strana i montaža
22	Nabavka poluukrštaja sa dve skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° br. 20 i 25, Senjak, desna strana i montaža
23	Nabavka ukrštaja sa tri skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° i 60E1 - 200 - 6° br. 15, 16, 21, 22 između 9. i 10. koloseka i montaža
24	Nabavka ukrštaja sa tri skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° i 60E1 - 200 - 6° br. 13, 14, 17, 18 između 1. i 2. koloseka i montaža
25	Nabavka ukrštaja sa četiri skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° br. 1, 2, 3, 4 između 5. i 6. koloseka - Senjak i montaža
26	Nabavka ukrštaja sa četiri skretnice tipa 60E1 - 300 - 6° br. 32, 33, 34, 35 između 5. i 6. koloseka - Dedinje i montaža
27	Nabavka pričvrsnog pribora FAST CLIP
28	Nabavka pričvrsnog pribora VIPA
29	Nabavka pričvrsnog pribora VANGUARD
30	Izgradnja 7. i 8. koloseka van perona, senjačka strana - donji stroj
31	Izgradnja 7. i 8. koloseka van perona, senjačka strana - gornji stroj
32	Izgradnja 7. i 8. koloseka između perona - donji stroj
33	Izgradnja 7. i 8. koloseka između perona - gornji stroj
34	Izgradnja 7. i 8. koloseka van perona, dedinjska strana - donji stroj
35	Izgradnja 7. i 8. koloseka van perona, dedinjska strana - gornji stroj
36	Prijem 7. i 8. koloseka u eksploataciju i puštanje u rad
37	Izgradnja 3. i 4. koloseka van perona, senjačka strana - donji stroj
38	Izgradnja 3. i 4. koloseka van perona, senjačka strana - gornji stroj
39	Izgradnja 3. i 4. koloseka između perona - donji stroj
40	Izgradnja 3. i 4. koloseka između perona - gornji stroj
41	Izgradnja 3. i 4. koloseka van perona, dedinjska strana - donji stroj
42	Izgradnja 3. i 4. koloseka van perona, dedinjska strana - gornji stroj
43	Prijem 3. i 4. koloseka u eksploataciju i puštanje u rad (ukidanje privremene veze - levi Banatski)
44	Izgradnja 9. i 10. koloseka van perona, senjačka strana - donji stroj
45	Izgradnja 9. i 10. koloseka van perona, senjačka strana - gornji stroj
46	Izgradnja 9. i 10. koloseka između perona - donji stroj
47	Izgradnja 9. i 10. koloseka između perona - gornji stroj
48	Izgradnja 9. i 10. koloseka van perona, dedinjska strana - donji stroj
49	Izgradnja 9. i 10. koloseka van perona, dedinjska strana - gornji stroj
50	Prijem 9. i 10. koloseka u eksploataciju i puštanje u rad
51	Izrada konstrukcije II perona
52	Izrada kablovske kanalizacije na II peronu
53	Građevinsko zanatski radovi na peronima - bravarski radovi
54	Građevinsko zanatski radovi na peronima - čeličarski radovi
55	Građevinsko zanatski radovi na peronima - limarski radovi
56	Građevinsko zanatski radovi na peronima - keramičarski radovi
57	Građevinsko zanatski radovi na peronima - kamenorezački radovi
58	Građevinsko zanatski radovi na peronima - molersko farbarski radovi
59	Građevinsko zanatski radovi na peronima - podopolagački radovi
60	Građevinsko zanatski radovi na peronima - suvomontažni radovi
61	Građevinsko zanatski radovi na peronima - stolarski radovi
62	Građevinsko zanatski radovi na peronima - razni radovi
63	Konstrukcija pothodnika ispod II perona
64	Obrada rupa za konvejere
65	Vestibil senjačkog pothodnika
66	Vestibil dedinjskog pothodnika
67	Rampa između osa 7 i 8
68	Šaht vrtložne komore C1
69	Šaht vrtložne komore C4
70	Veza poprečne galerije sa podužnom galerijom i rampom
71	Izrada gradilišnog puta
72	Građevinski radovi u pothodnicima
73	Bravarski radovi u pothodnicima
74	Keramičarski radovi u pothodnicima
75	Molersko farbarski radovi u pothodnicima
76	Podopolagački radovi u pothodnicima
77	Suvomontažni radovi u pothodnicima
78	Stolarski radovi u pothodnicima
79	Razni radovi u pothodnicima
80	Izgradnja instalacione galerije u I peronu
81	I peron - naglavna greda između osa 10 i 12
82	I peron - stubovi između osa 10 i 12
83	I peron - kosa rampa između osa 9 i 10
84	Hidroizolacija ploče na koti 105
85	Završni i zanatski radovi na ploči na koti 105
86	Postavnica - rušenje i demontaža
87	Postavnica - zidarski radovi
88	Postavnica - fasada
89	Postavnica - ostali građevinski radovi
90	Postavnica - otpravnik vozova
91	Postavnica - prostorije za smeštaj uređaja
92	Piktogrami
93	Vodovod i kanalizacija - spoljne instalacije
94	Vodovod i kanalizacija - unutrašnje instalacije
95	Termotehničke instalacije
96	Kontaktna mreža - 7. kolosek
97	Kontaktna mreža - 8. kolosek
98	Kontaktna mreža - 3. kolosek
99	Kontaktna mreža - 4. kolosek
100	Trafostanica TS 25/0,23 kV, Senjak
101	Trafostanica TS 25/0,23 kV, Dedinje 1
102	Trafostanica TS 25/0,23 kV, Dedinje 2
103	Trafostanica TS 25/0,23 kV, Karađorđev park
104	Izrada izvođačkog i montažnog projekta SS Uređaja
105	Isporuka unutrašnjih SS uređaja (napojni, interfejs, ramovi, elektronska postavnica)
106	Isporuka signala i pokazivača pravaca
107	Isporuka postavnih sprava
108	Isporuka grejača skretnica
109	Isporuka brojača osovina
110	Isporuka pružnih baliza
111	Isporuka kablova na gradilište
112	Montaža uređaja stanične postavnice
113	Montaža SS opreme na 7. i 8. koloseku
114	Montaža SS opreme na 3. i 4. koloseku
115	Montaža SS opreme na 9. i 10 koloseku
116	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 3
117	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 1
118	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 2
119	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 4
120	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 5
121	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 8
122	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 34
123	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 32
124	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 35
125	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 33
126	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 6
127	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 9
128	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 29
129	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 39
130	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 10
131	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 12
132	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 7 i 11
133	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 19 i 23
134	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 27
135	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 24
136	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 30
137	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 26
138	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 15, 16, 21, 22
139	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 20, 25
140	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 31
141	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 28
142	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 1a
143	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 1b
144	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 40, 41, 42, 43
145	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 44, 45
146	Montaža skretničkih sprava za skretnicu br. 13, 14, 17, 18
147	Oživljavanje pojedinačnih elemenata osiguranja
148	Ispitivanje puteva vožnji
149	Ispitivanje međuzavisnosti
150	Puštanje u rad novog SS uređaja
151	Isporuka lokalnih TT kablova i montaža
152	Isporuka dispečerskih uređaja i montaža opreme
153	Ispitivanje i puštanje u rad dispečerskih uređaja u rad
154	Isporuka i montaža video nadzora
155	Vizuelno obaveštavanje putnika, isporuka i montaža
156	Ozvučenje, isporuka i montaža
157	Satni sistem, isporuka i montaža
158	Automatska dojava požara, isporuka i montaža
159	Strukturno kabliranje u postavnici
160	Automatska dojava požara u postavnici
161	Video nadzor u postavnici
162	Satni sistem u postavnici
163	Telekomunikacione instalacije u stajalištu Karađorđev park
164	Energetska postrojenja, razvodni ormani, isporuka i montaža
165	Energetska postrojenja, napojni kablovi, isporuka i montaža
166	Energetska postrojenja, rasveta, isporuka i montaža
167	Elektroenergetske instalacije u dedinjskom pothodniku
168	Elektroenergetske instalacije u senjačkom pothodniku
169	Elektroenergetske instalacije u stajalištu Karađorđev park
170	Postavnica, razvodni ormani
171	Postavnica, napojni kablovi
172	Postavnica, osvetljenje
173	Postavnica, priključnice
174	Postavnica, uzemljivač i gromobran
175	Završna ispitivanja
176	Izrada projekta izvedenog objekta
177	Tehnički pregled objekta
